UUSI LASTENSAIRAALA – MAAILMAN PARASTA HOITOA LAPSILLE



KÄYTTÖÖNOTTO JA PILOTOITU KÄYTTÖÖNOTON OPAS

KATJA TAATTOLA
KLIININEN ASIANTUNTIJA, LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET

UUSI LASTENSAIRAALA -AINUTLAATUINEN RAKENNUSHANKE

MAAILMAN PARASTA HOITOA LAPSILLE JA PERHEILLE

- Uuden lastensairaalan tarina on Suomessa ainutlaatuinen.
- Rakennusprojekti sai taakseen Uusi Lastensairaala Tukisäätiön, jonka päämääränä oli rakentaa uudet tilat huipputasoista hoitoa tarjoavalle lastensairaalalle.
- Sairaalan rakentamisesta tuli nopeasti koko Suomen hanke.
- Tukiyhdistyksen helmikuussa 2013 käynnistämä kansalaiskeräys tuotti lähes 40 miljoonaa euroa.
- Uuteen lastensairaalaan on lahjoitettu lisäksi muun muassa rakennustarvikkeita, teknologiaa, sairaalakalusteita sekä taidetta.

18

HUS



UUDEN LASTENSAIRAALAN LUKUJA

- 4 530 betonielementtiä
- 27 000 m3 betonivalua
- 13 000 keraamista verhouselementtiä ulkoseinässä
- 800 ikkunaa julkisivussa
- 7 500 m2 vesikattoa
- 55 000 m2 väliseinää
- 3 000 yksikköä sisäovia, -ikkunoita ja sähköpieliä
- 31 000 m2 alakattoa
- 2 300 yksikköä kiintokalusteita
- 11 km viemäriputkea
- 37 km lämmitys- ja jäähdytysputkistoja.
- 40 km käyttövesiputkistoja
- 49 kpl Ilmanvaihtokoneita ja 90 kpl erillispuhaltimia
- 1 300 km sähkökaapelia
- 800 km tietoliikennekaapelia

Kokonaispinta-ala
48 000 m2


TK1



UUDEN LASTENSAIRAALAN KÄYTTÖÖNOTTO

3.12.2018

katja.taattola@hus.fi

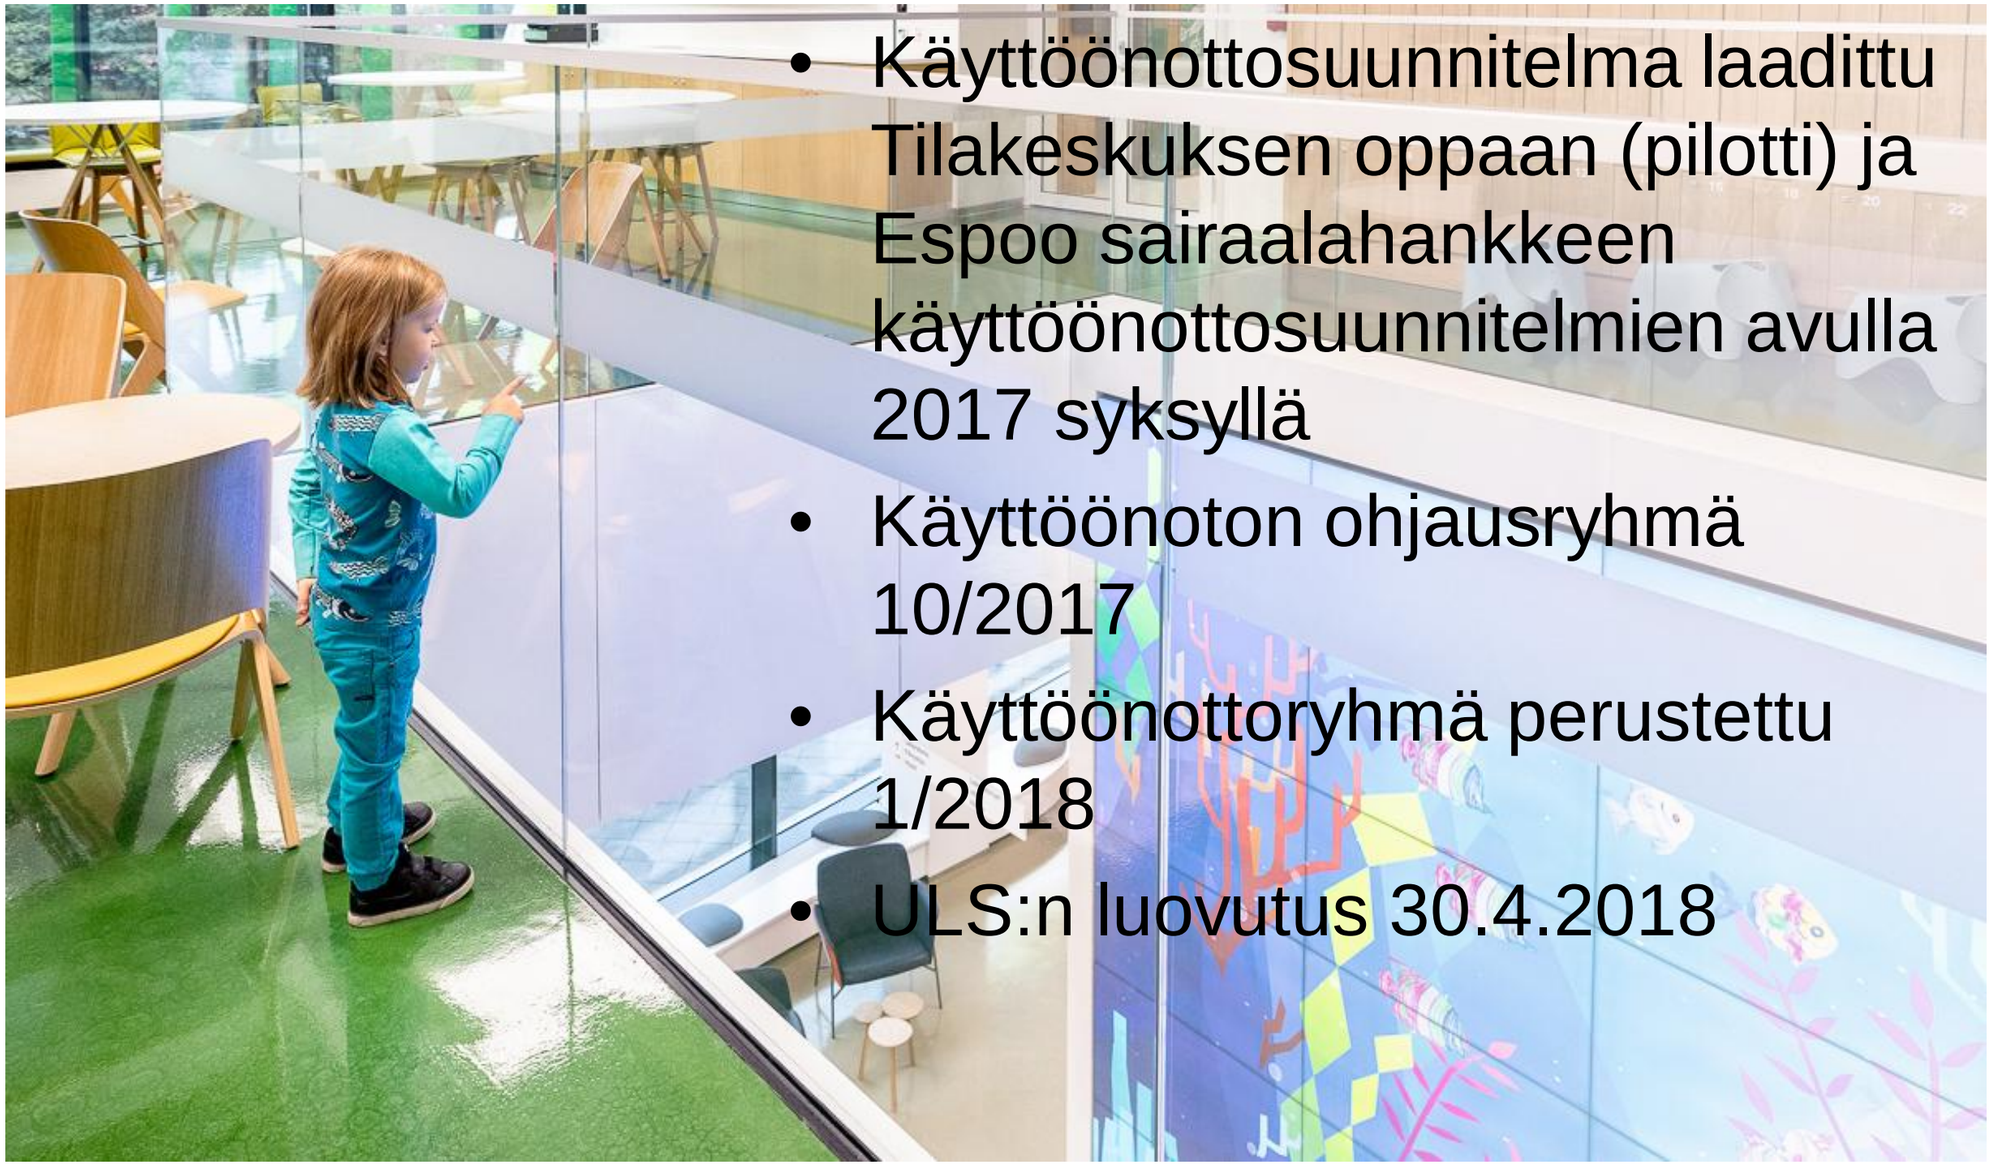

- Käyttöönottosuunnitelma laadittu Tilakeskuksen oppaan (pilotti) ja Espoo sairaalahankkeen käyttöönottosuunnitelmien avulla 2017 syksyllä
- Käyttöönoton ohjausryhmä 10/2017
- Käyttöönottoryhmä perustettu 1/2018
- ULS:n luovutus 30.4.2018

KÄYTTÖÖNOTON ORGANISAATIO



KÄYTTÖÖNOTON JOHTAMINEN



- Käyttöönotto: seisomapalaverit ma-ke-pe klo 7.30 pääaulassa 4.6-14.9
  - Rakennuttajakonsultti
  - Srv
  - Cramo
  - Käyttöönottotiimi
  - Tietohallinto
  - Niemi kalustajat
  - Laitoshuolto
- Tulevat tapahtumat, työt, epäselvyydet
- Muuttoviikoilla käyttöönottoryhmä töissä 7-21.45 joka päivä

HANKINNAT

- Pääperiaate: kiinteät kalusteet jotka suunnitelmissa esitetty koodein kuuluivat hankkeelle, irtokalusteet ja koodaamattomat kiintokalusteet Lanulle. Rajanvetoa pitkin matkaa.
- Lanun hankinnoista vastasi Lanun taloussuunnittelija
- Toimituksista sovittiin käyttöönottoryhmän ja Cramon edustajan kanssa joka operoi logistiikkaa käyttöönoton aikana



TURVALLISUUS

- Avaimet ja kulkuoikeudet ULS:aan käyttöönoton aikana
  - 300 Lanun henkilökuntaa porrastettuna
  - muita toimijoita 300-400
- Palo ja pelastustoimet käyttöönottoajan ja normaalitoiminnan aikana
- Poikkeustilanteet
- Työturvallisuus



KÄYTTÖÖNOTTOKOULUTUKSET

- Koordinointi Lanun omalla koulutuskoordinaattorilla
- Koulutusten, infojen, perehdytysten ja käytönopastusten ajoittaminen ja synkronointi muuhun käyttöönottoon ja lomiin
- Kaikkiaan ULS koulutuksiin osallistui 3663 henkilöä
- Koulutustilaisuuksia toteutui 135 kappaletta



YLEINEN KOULUTUS

Muuttava henkilökunta saa valmiudet työskennellä uusissa tiloissa.

Syys-joulukuu 2017

ULS Kick off 27.10 klo 12 - 15
ULS yleinen-infot:
3.10.2017 ja 30.11.2017

Maaliskuu – kesäkuu 2018

ULS yleinen -info 11.4 klo 14 - 15
Talon käyttöönottokoulutus 4.5. –11.6.2018
Paloturvallisuuskoulutus 12.ja 18.6

Tammi – helmikuu 2018


Tutustumiskierrokset ULS (osa A&B) 29.1 – 7.2.2018
Muuttovalmennus 15.1 -15.2. 2018
ULS yleinen-info 26.2.2018

Elokuu – lokakuu 2018


ULS yleinen info 22.8.2018 klo 14 - 15
Yksiköiden perehdytyspäivät 17.8. – 18.9.2018
Paloturvallisuuskoulutus 1. ja 2.10

Lisäksi esimiehille esimiesinfot 3 vkon välein

MUUTTO

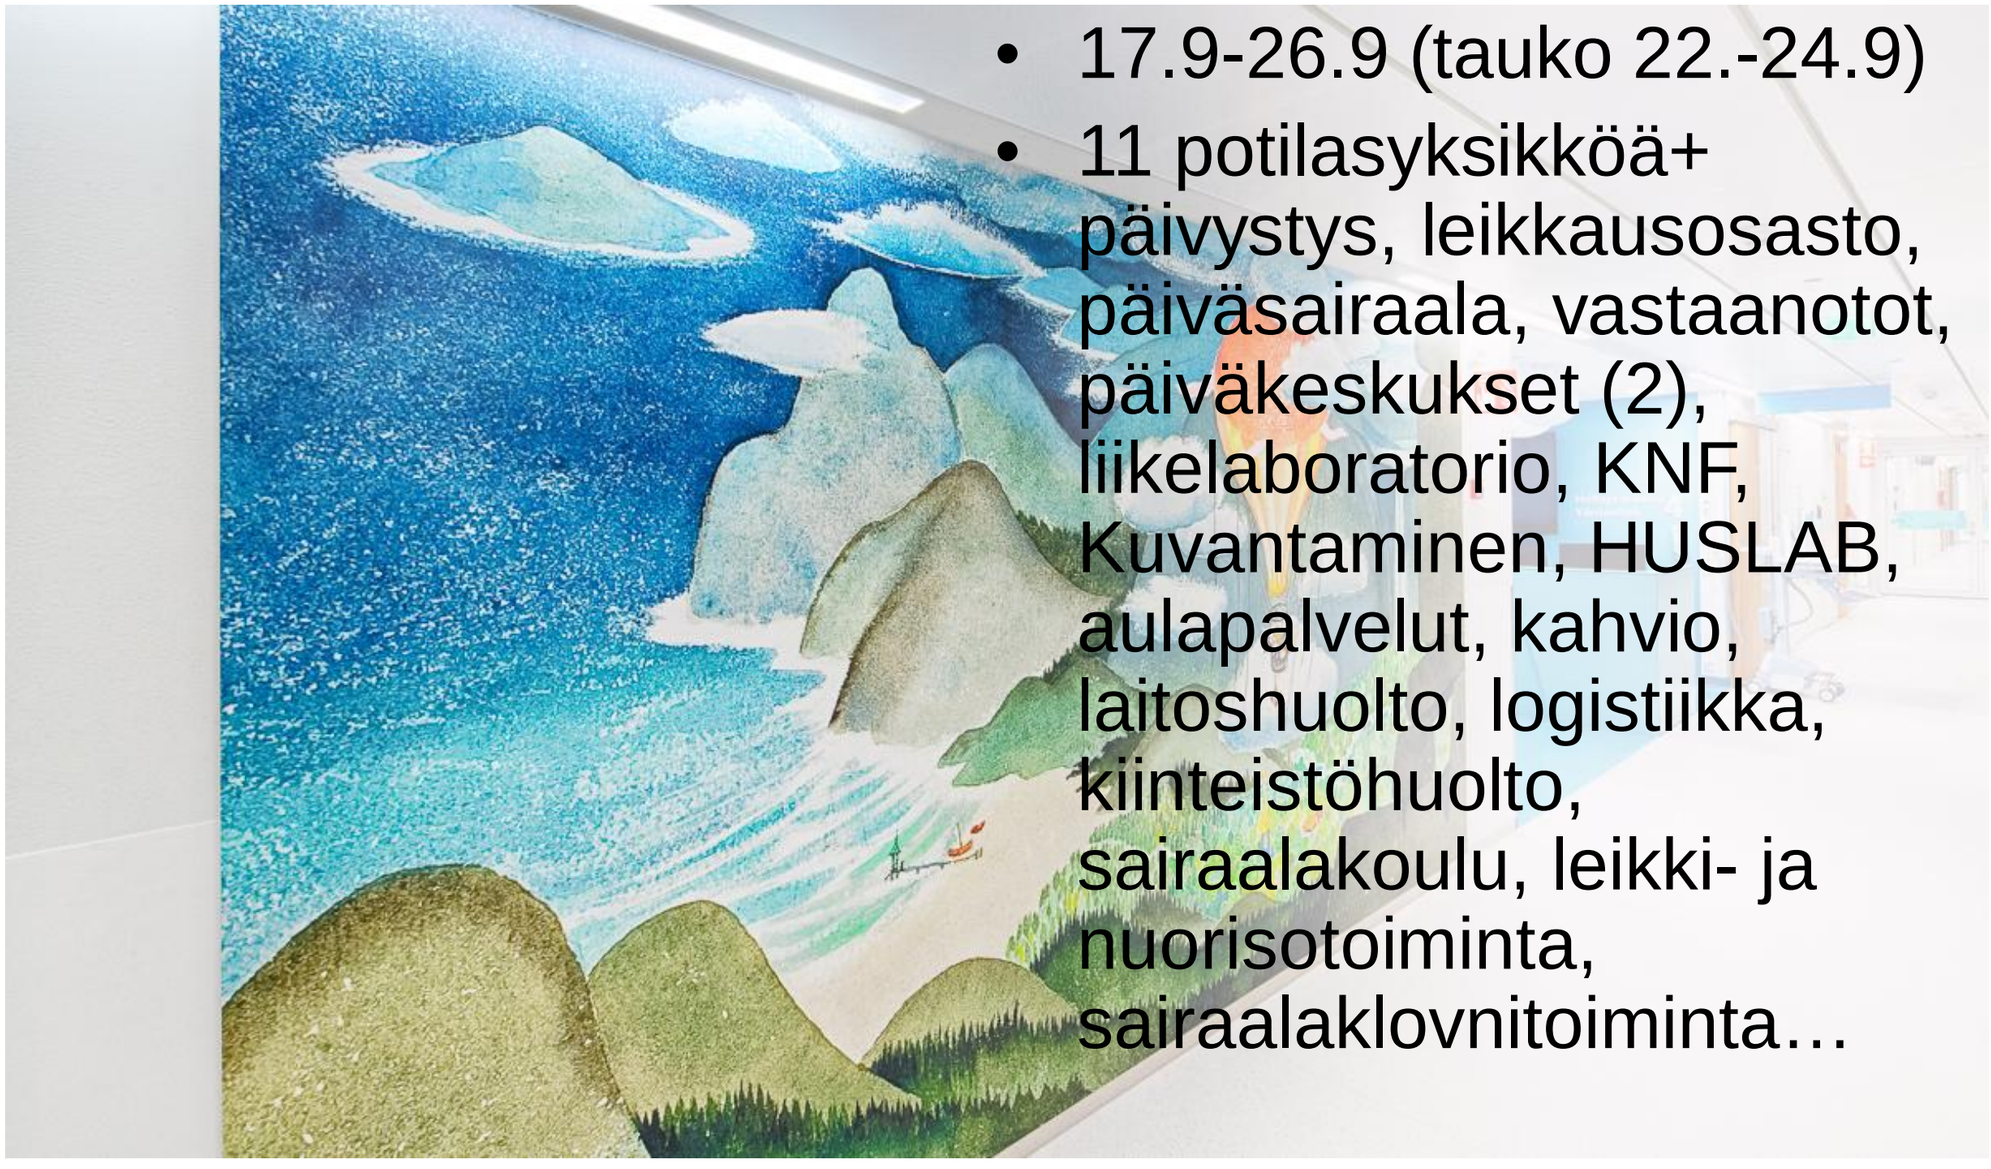


- 17.9-26.9 (tauko 22.-24.9)
- 11 potilasyksikköä+ päivystys, leikkausosasto, päiväsairaala, vastaanotot, päiväkeskukset (2), liikelaboratorio, KNF, Kuvantaminen, HUSLAB, aulapalvelut, kahvio, laitoshuolto, logistiikka, kiinteistöhuolto, sairaalakoulu, leikki- ja nuorisotoiminta, sairaalaklovnitoiminta…

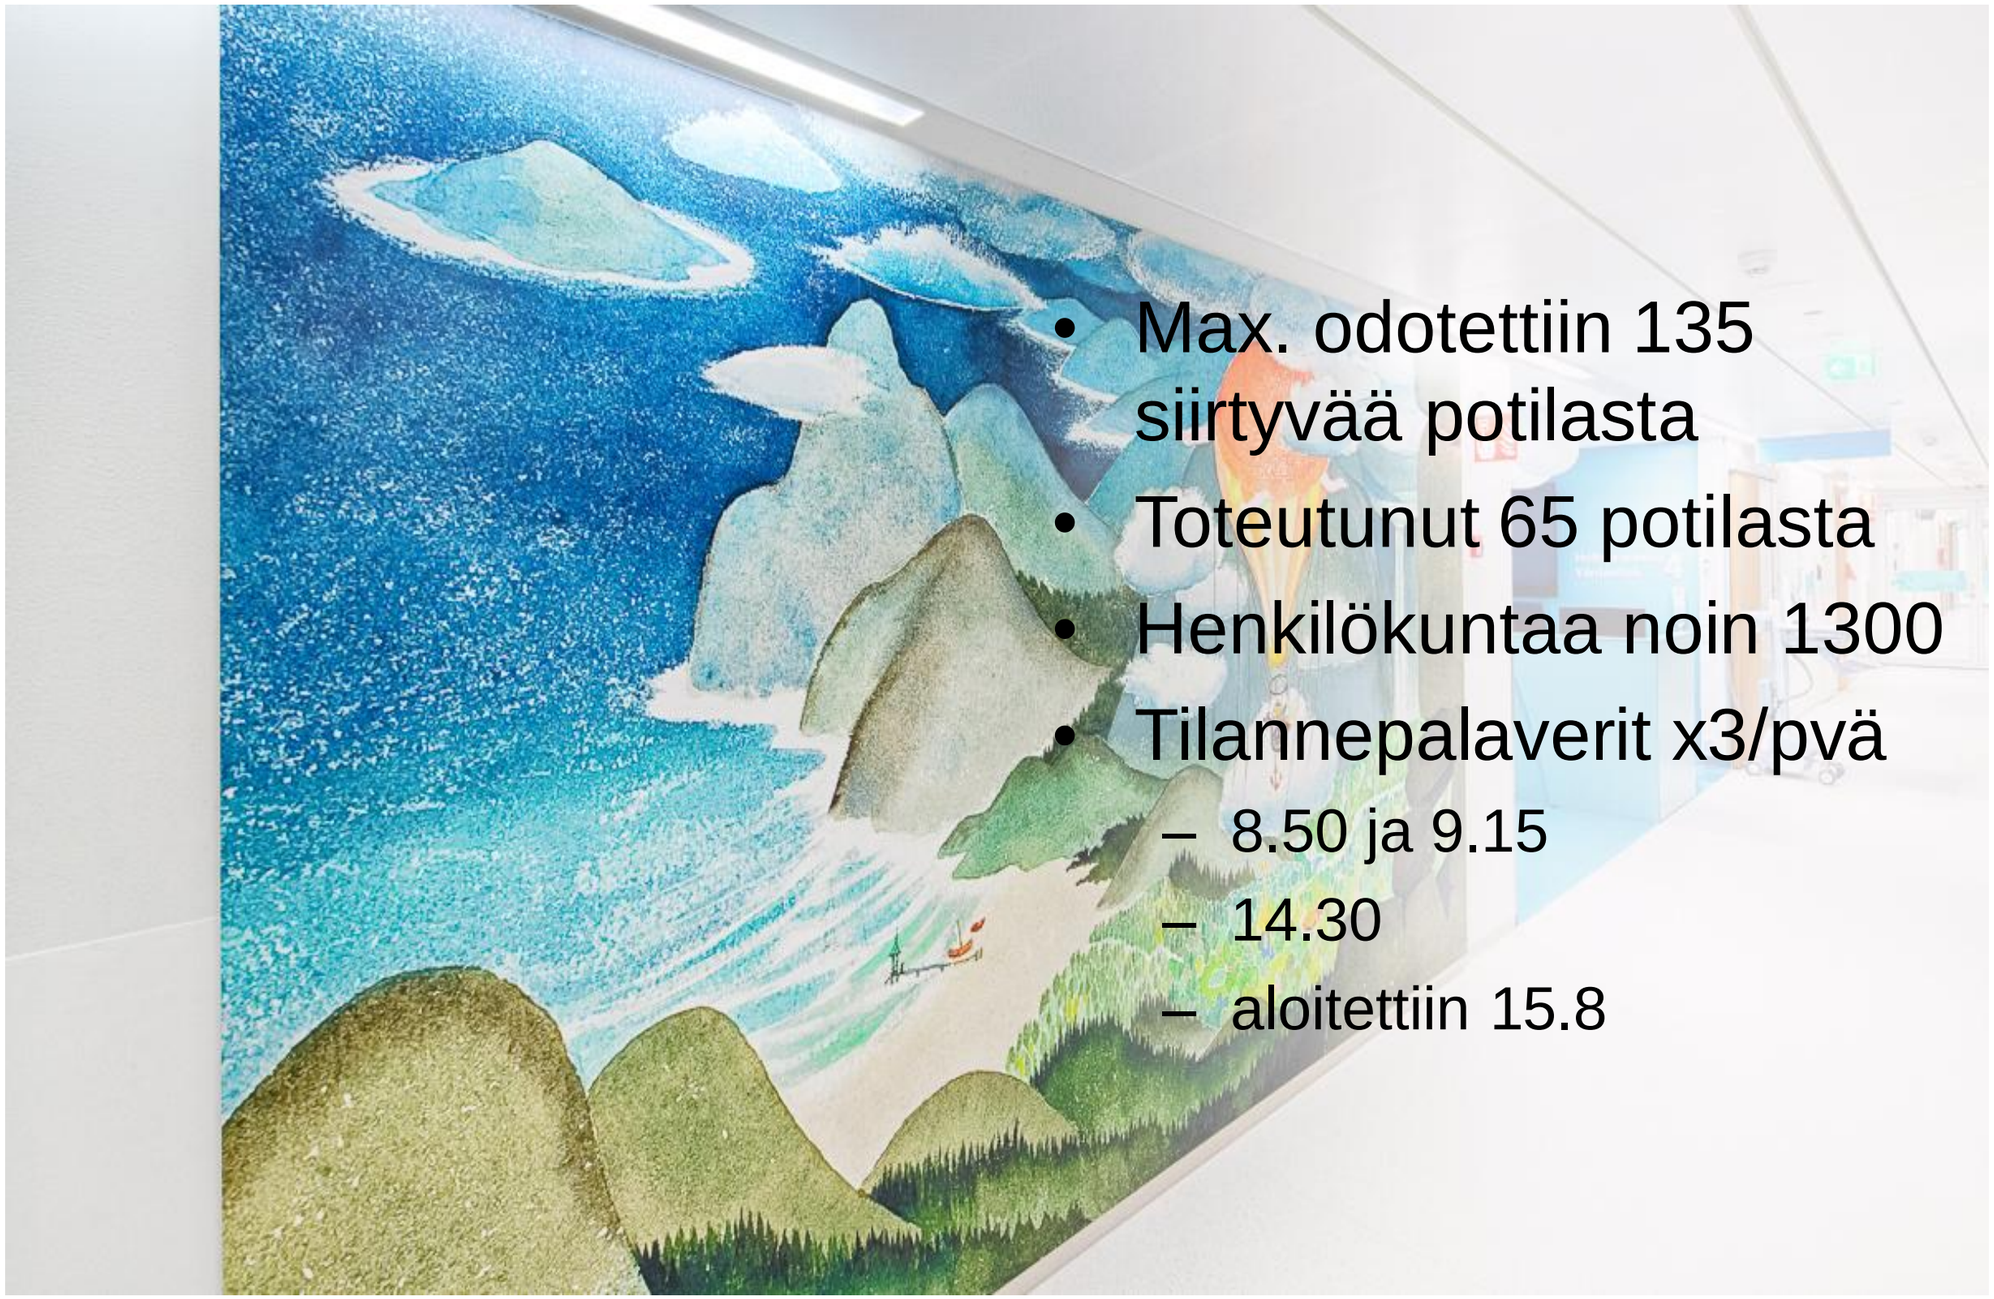

- Max. odotettiin 135 siirtyvää potilasta
- Toteutunut 65 potilasta
- Henkilökuntaa noin 1300
- Tilannepalaverit x3/pvä
  - 8.50 ja 9.15
  - 14.30
  - aloitettiin 15.8

TAVARAMUUTOT, ASENNUKSET

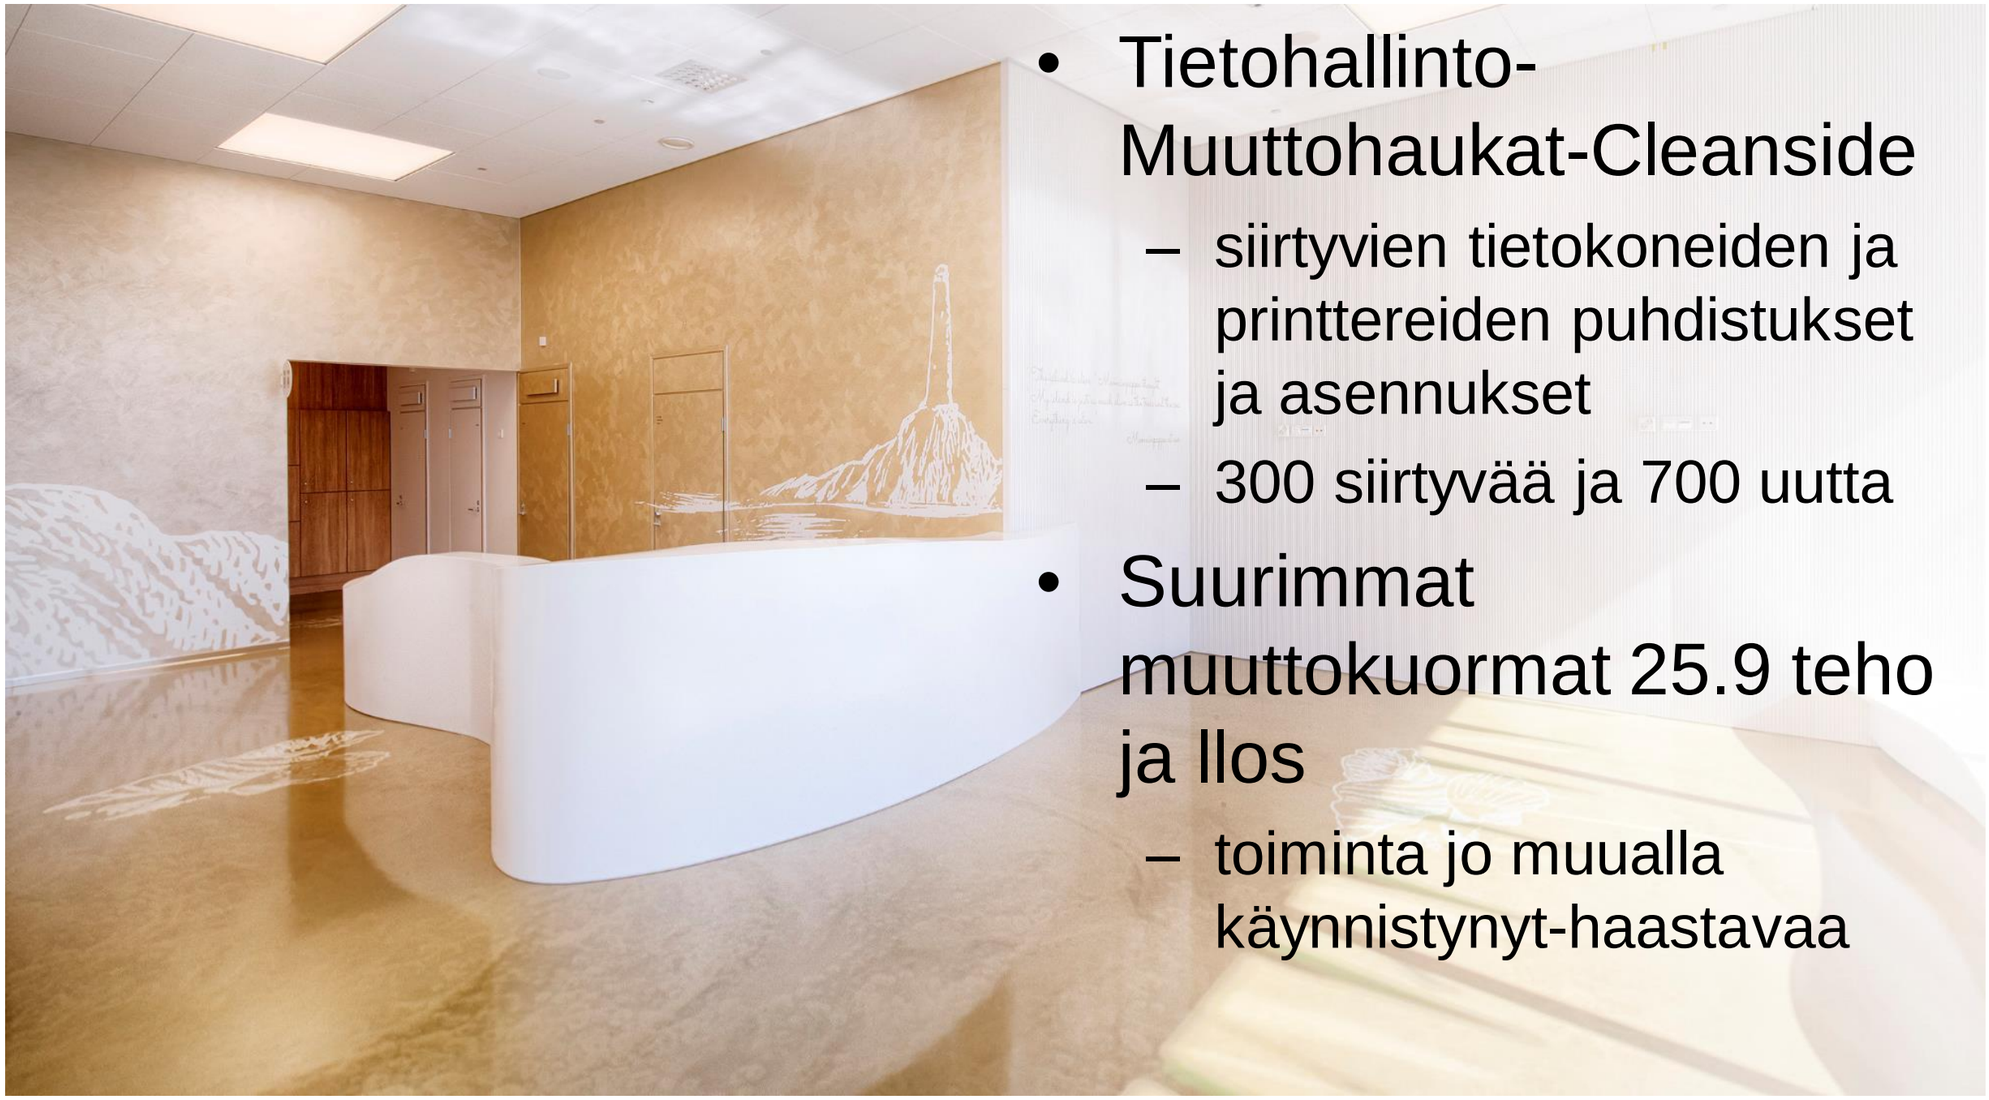

- Tietohallinto-Muuttohaukat-Cleanside
  - siirtyvien tietokoneiden ja printtereiden puhdistukset ja asennukset
  - 300 siirtyvää ja 700 uutta
- Suurimmat muuttokuormat 25.9 teho ja llos
  - toiminta jo muualla käynnistynyt-haastavaa



- Uudet koneet asennettiin valmiiksi ennen yksikön muuttopäivää
- Puhdistuksesta koneet osa edellisenä päivänä, osa muuttopäivänä, osa seuraavana päivänä
- ICT:n toiminnassa ongelmia, myös nostin
- Prosesseissa vielä paljon tarkennettavaa

KIITOS

